



Provincia di Campobasso

4° dipartimento - 1° Servizio

DANNI DIFFUSI SULLE STRADE PROVINCIALI
GRUPPO STRADALE N° 4 DI VINCHIATURO
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 135 "MIRABELLO-VINCHIATURO"

PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTO PROGETTO € . 200.000,00

ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- COROGRAFIA
- PLANIMETRIA -PROGR. 0+00 - 3+450
- PLANIMETRIA - PROGR. 3+450-6+200
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- SOMMARIO NUMERICO
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- CRONOPROGRAMMA
- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- PIANO DI MANUTENZIONE
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- SCHEMA CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ING. PASQUALE STOPPIELLO)

IL PROGETTISTA E D.L.
(GEOM. GIANDONATO BOZZA)

DATA: FEBBRAIO 2013

AGG.TO: SETTEMBRE 2014

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
(GEOM. GIANDONATO BOZZA)

ALLEGATO "A"

Comune di Campobasso
Provincia di CB

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 135 " MIRABELLO-VINCHIATURO"

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CANTIERE: S.P. n° 135, Campobasso (CB)

Campobasso, li 01/09/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra BOZZA Giandonato)

IL COMMITTENTE
(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

geometra BOZZA Giandonato
via Roma 47
86100 Campobasso (CB)
0874401217 - 0874401976
giandonato.bozza@provincia.campobasso.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
S.P. n° 135 "Mirabello- Vinchiaturò"						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/04/2015	01/04/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	2	2	02/04/2015	03/04/2015
Demolizione di cordoli, zanelle e piccole opere d'arte stradale	1	E	3	5	09/04/2015	13/04/2015
Scavo di sbancamento	1	E	3	3	14/04/2015	16/04/2015
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	5	17/04/2015	21/04/2015
realizzazione di drenaggi	1	E	3	3	22/04/2015	24/04/2015
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	4	4	27/04/2015	30/04/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	3	3	04/05/2015	06/05/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	07/05/2015	08/05/2015
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	1	E	2	2	07/04/2015	08/04/2015
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/05/2015	08/05/2015
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	11/05/2015	11/05/2015
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	1	E	1	1	11/05/2015	11/05/2015
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	3	3	18/05/2015	20/05/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	4	4	12/05/2015	15/05/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	3	5	21/05/2015	25/05/2015
demolizione con mezzi meccanici di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	26/05/2015	27/05/2015
Formazione di fondazione stradale	1	E	2	2	28/05/2015	29/05/2015
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	29/05/2015	29/05/2015
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/06/2015	01/06/2015
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	6	9	01/06/2015	09/06/2015
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/06/2015	09/06/2015
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/06/2015	10/06/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	9	13	10/06/2015	22/06/2015

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/06/2015	22/06/2015
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	23/06/2015	23/06/2015
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	23/06/2015	23/06/2015
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	23/06/2015	23/06/2015
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	24/06/2015	24/06/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	6	25/06/2015	30/06/2015
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	30/06/2015	30/06/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

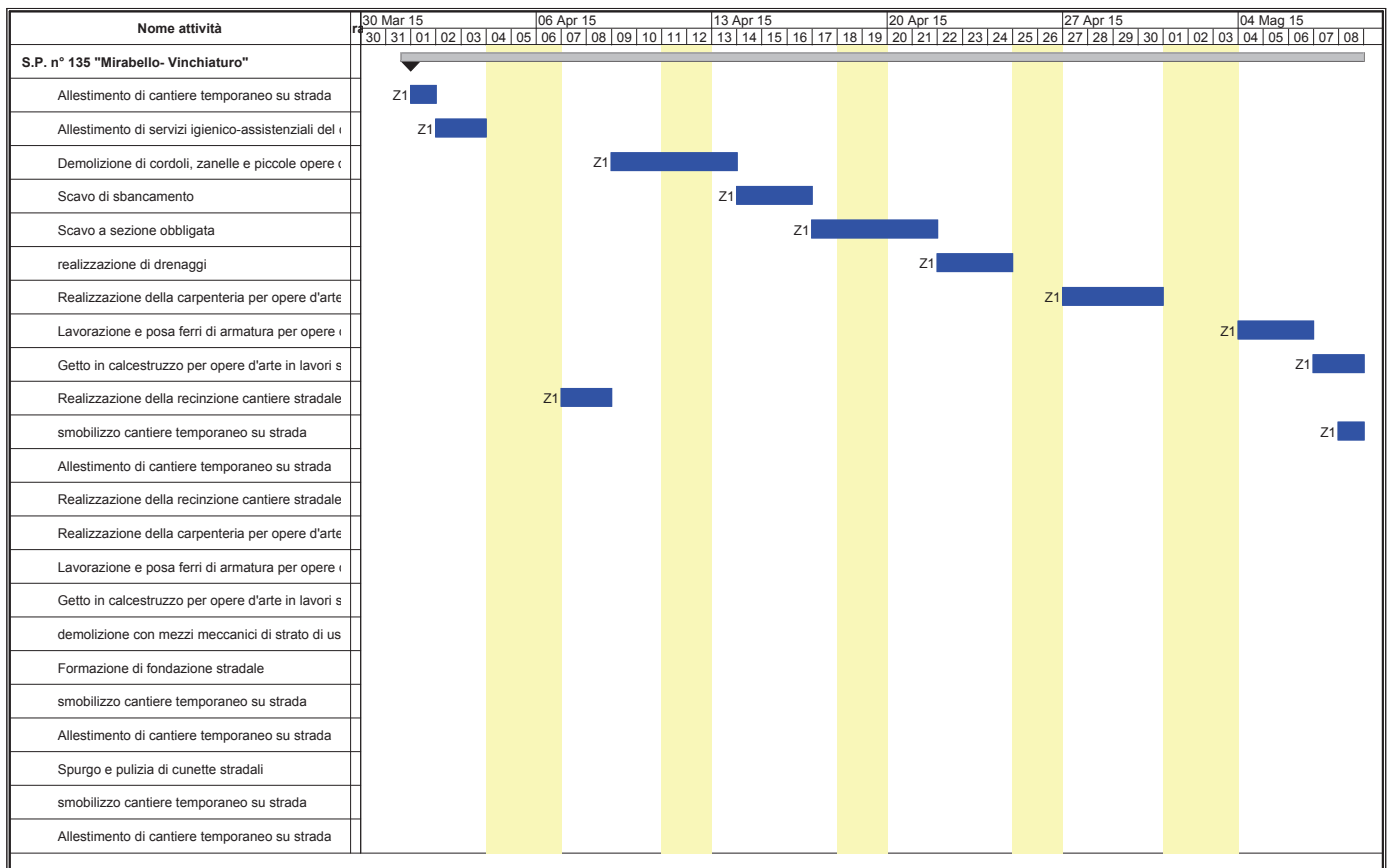

Nome attività	30 Mar 15				06 Apr 15				13 Apr 15				20 Apr 15				27 Apr 15				04 Mag 15																							
	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08				
Formazione di manto di usura e collegamento																																												
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																																												
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																																												
Montaggio di guard-rails su rilevato																																												
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																																												
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																																												
Realizzazione di segnaletica orizzontale																																												
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																																												
LEGENDA Zona:																																												
Z1 = ZONA UNICA																																												

