

ALLEGATO "A"

Comune di Campobasso
Provincia di CB

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DEL GRUPPO STRADALE N° 5 DI RICCIA - APQ L. 112/98 - ESERCIZIO 2014

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CANTIERE: SP.n° 114-162-32-107-103-101-61-93-72, Campobasso (CB)

Campobasso, li 07/05/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra BOZZA Giandonato)

IL COMMITTENTE
(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

geometra BOZZA Giandonato
via Roma 47
86100 Campobasso (CB)
0874401217 - 0874401976
giandonato.bozza@provincia.campobasso.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
S.P. n° 114 Tufara ponte 13 archi						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	01/08/2014	01/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	4	01/08/2014	04/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	04/08/2014	04/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/08/2014	05/08/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	05/08/2014	06/08/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	07/08/2014	07/08/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	07/08/2014	07/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/08/2014	07/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/08/2014	08/08/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	4	08/08/2014	11/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	11/08/2014	11/08/2014
S.P. n° 162 Appulo Sannitica						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	12/08/2014	12/08/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	12/08/2014	12/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	12/08/2014	14/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/08/2014	14/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	18/08/2014	18/08/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	18/08/2014	19/08/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	20/08/2014	20/08/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	21/08/2014	21/08/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	21/08/2014	21/08/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/08/2014	22/08/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	4	22/08/2014	25/08/2014

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/08/2014	25/08/2014
S.P. n° 39 Centocelle						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/08/2014	26/08/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	26/08/2014	26/08/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	5	28/08/2014	01/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/09/2014	01/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	02/09/2014	02/09/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	02/09/2014	03/09/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	04/09/2014	04/09/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	05/09/2014	05/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/09/2014	05/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/09/2014	08/09/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	08/09/2014	09/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/09/2014	09/09/2014
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	27/08/2014	27/08/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	1	1	27/08/2014	27/08/2014
S.P. n° 107 Riccia Paolina						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/09/2014	10/09/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	10/09/2014	10/09/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	10/09/2014	12/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	12/09/2014	12/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	15/09/2014	15/09/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	15/09/2014	16/09/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	17/09/2014	17/09/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	2	2	18/09/2014	19/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	19/09/2014	19/09/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/09/2014	22/09/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	22/09/2014	23/09/2014
Posa di segnali stradali	1	E	2	2	24/09/2014	25/09/2014

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/09/2014	25/09/2014
S.P. n° 101 mazzocca-Riccia						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/09/2014	26/09/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	26/09/2014	26/09/2014
Demolizione di cordoli, zanelle e piccole opere d'arte stradale	1	E	1	1	29/09/2014	29/09/2014
Scavo a sezione obbligata	1	E	1	1	30/09/2014	30/09/2014
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	01/10/2014	02/10/2014
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	02/10/2014	03/10/2014
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	1	1	06/10/2014	06/10/2014
Formazione di fondazione stradale	1	E	1	1	07/10/2014	07/10/2014
Realizzazione della recinzione cantiere stradale	1	E	1	1	26/09/2014	26/09/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/10/2014	07/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/10/2014	08/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	08/10/2014	10/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/10/2014	10/10/2014
S.P. n° 61 Del Fortore						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/10/2014	13/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	13/10/2014	13/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	13/10/2014	15/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	15/10/2014	15/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	16/10/2014	16/10/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	2	16/10/2014	17/10/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/10/2014	20/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	21/10/2014	21/10/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	21/10/2014	22/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/10/2014	22/10/2014
S.P. n° 93 Riccia -Cercemaggiore						

Tabella Analitica Gantt

Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	23/10/2014	23/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	23/10/2014	23/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	23/10/2014	24/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	24/10/2014	24/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	27/10/2014	27/10/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	1	1	27/10/2014	27/10/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	28/10/2014	28/10/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	28/10/2014	28/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/10/2014	28/10/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	29/10/2014	29/10/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	29/10/2014	30/10/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	30/10/2014	30/10/2014
S.P. n° 162 Gambatesa ponte 13 archi						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	31/10/2014	31/10/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	31/10/2014	31/10/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	4	31/10/2014	03/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	03/11/2014	03/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	04/11/2014	04/11/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	1	1	04/11/2014	04/11/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	05/11/2014	05/11/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	05/11/2014	05/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/11/2014	05/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	06/11/2014	06/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	06/11/2014	07/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/11/2014	07/11/2014
S.P. n° 72 Fiumarello Monacilioni						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/11/2014	10/11/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	10/11/2014	10/11/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	10/11/2014	11/11/2014

Tabella Analitica Gantt

smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	11/11/2014	11/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	12/11/2014	12/11/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	1	1	12/11/2014	12/11/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	13/11/2014	13/11/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	13/11/2014	13/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/11/2014	13/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/11/2014	14/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	4	14/11/2014	17/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	17/11/2014	17/11/2014
S.P. n° 103 Riccia Gambatesa						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	18/11/2014	18/11/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere stradale	1	E	1	1	18/11/2014	18/11/2014
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	3	18/11/2014	20/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/11/2014	20/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	21/11/2014	21/11/2014
Spurgo e pulizia di cunette stradali	1	E	2	4	21/11/2014	24/11/2014
rimozione di guard-rails	1	E	1	1	25/11/2014	25/11/2014
Montaggio di guard-rails su rilevato	1	E	1	1	25/11/2014	25/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	25/11/2014	25/11/2014
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/11/2014	26/11/2014
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	26/11/2014	28/11/2014
smobilizzo cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/11/2014	28/11/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

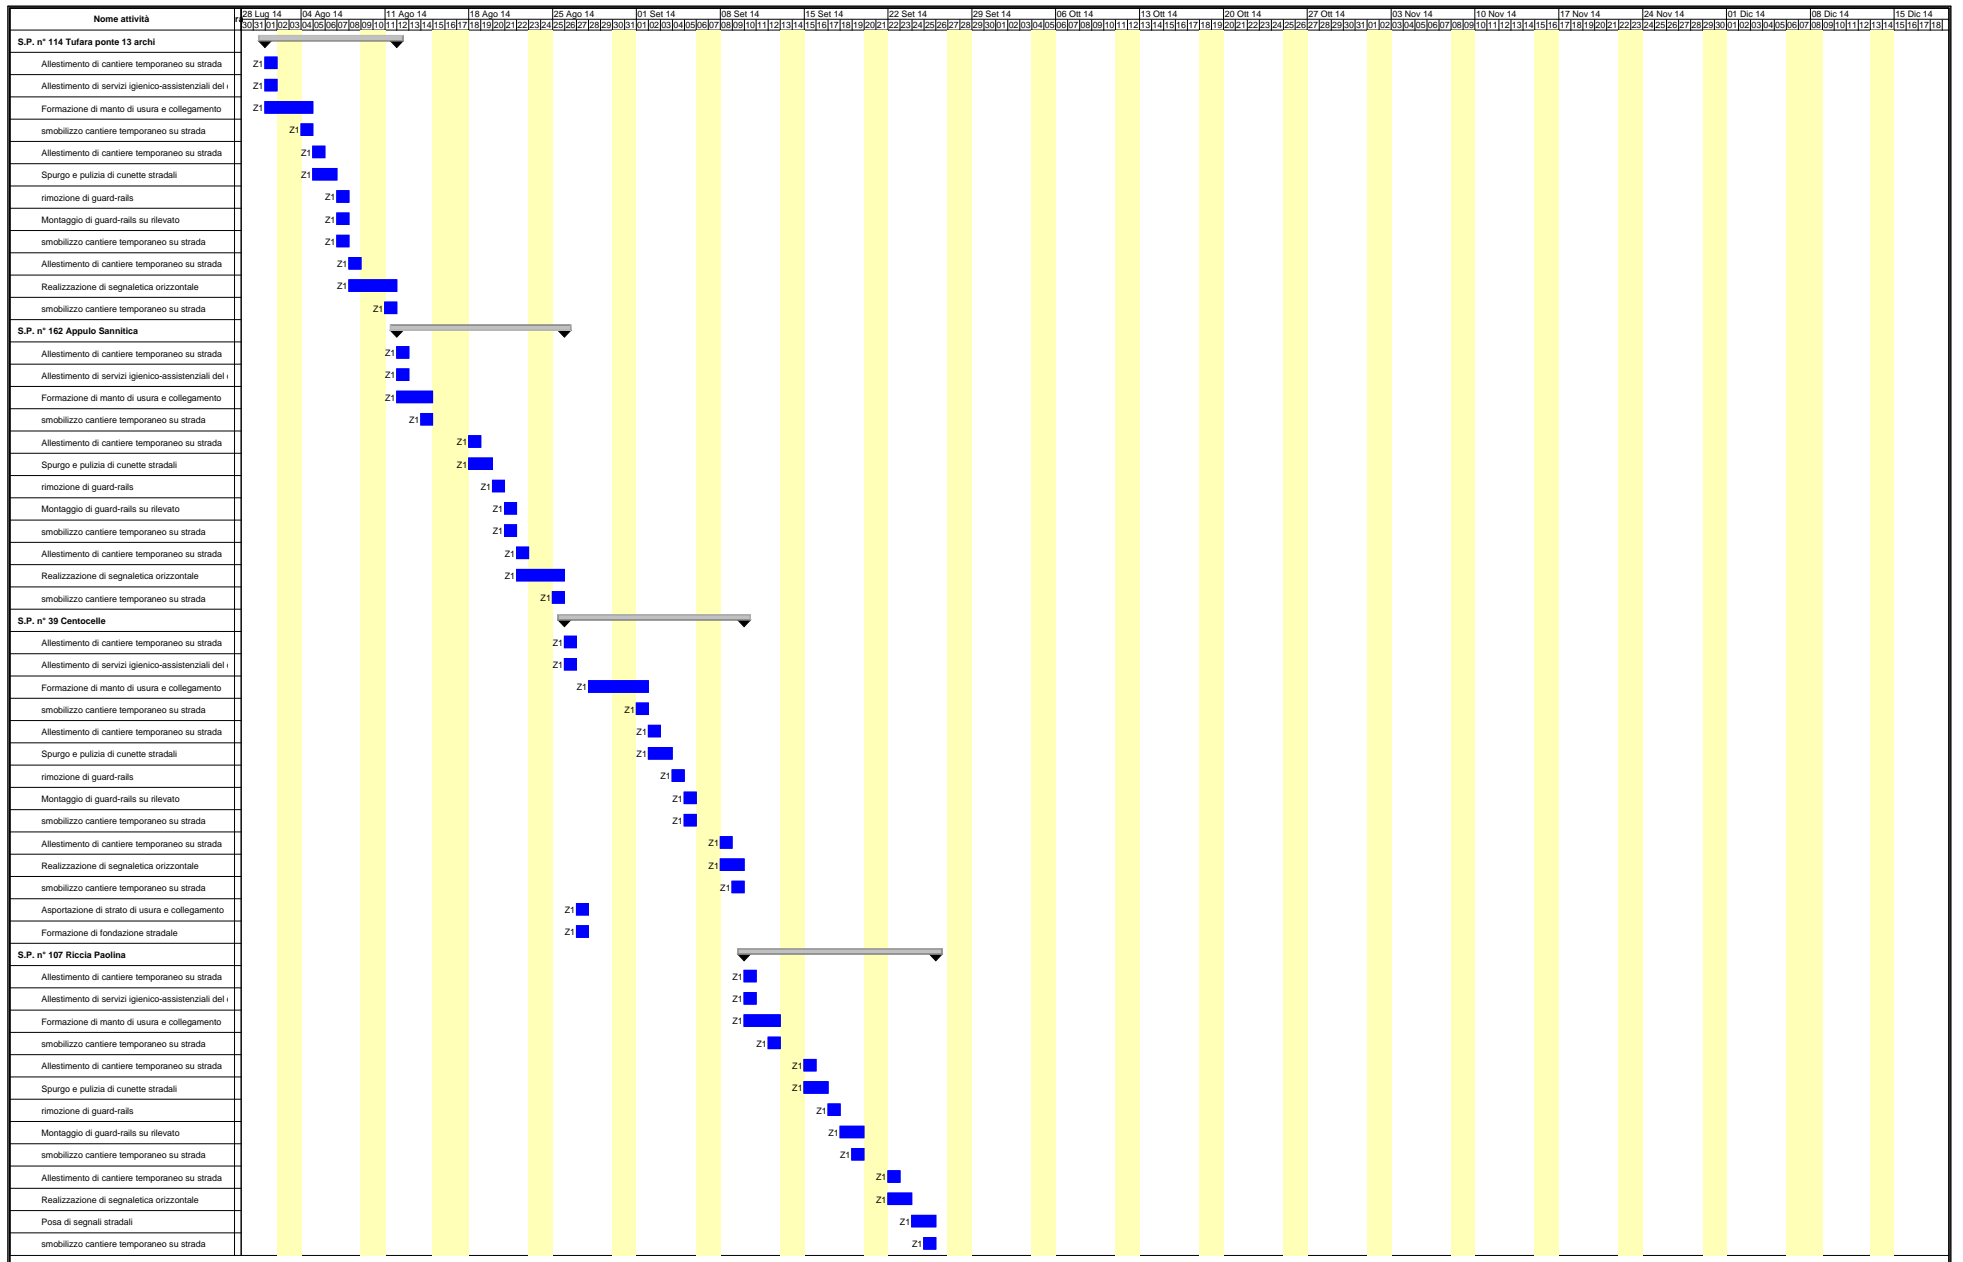

Nome attività	28 Lug 14	04 Ago 14	11 Ago 14	18 Ago 14	25 Ago 14	01 Set 14	08 Set 14	15 Set 14	22 Set 14	29 Set 14	06 Ott 14	13 Ott 14	20 Ott 14	27 Ott 14	03 Nov 14	10 Nov 14	17 Nov 14	24 Nov 14	01 Dic 14	08 Dic 14	15 Dic 14	
	30	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	
S.P. n° 101 mazzocca-Riccia																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																						
Demolizione di cordoli, zanelle e piccole opere di cemento																						
Scavo a sezione obbligata																						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte																						
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori di restauro																						
Formazione di fondazione stradale																						
Realizzazione della recinzione cantiere stradale																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Formazione di manto di usura e collegamento																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
S.P. n° 61 Del Fortore																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																						
Formazione di manto di usura e collegamento																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Spurgo e pulizia di cunette stradali																						
rimozione di guard-rails																						
Montaggio di guard-rails su rilevato																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
S.P. n° 93 Riccia -Cercemaggiore																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																						
Formazione di manto di usura e collegamento																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Spurgo e pulizia di cunette stradali																						
rimozione di guard-rails																						
Montaggio di guard-rails su rilevato																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
S.P. n° 162 Gambatesa ponte 13 archi																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																						
Formazione di manto di usura e collegamento																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Spurgo e pulizia di cunette stradali																						
rimozione di guard-rails																						
Montaggio di guard-rails su rilevato																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						
Realizzazione di segnaletica orizzontale																						
smobilizzo cantiere temporaneo su strada																						
S.P. n° 72 Fiumarello Monacilioni																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada																						

